

東元電機 機電系統事業群 (GM)

AI Agent 導入規劃書

商機分析師 × 報價策略決策

Autonomous Agent × EgentHub 雙層協作架構

智慧方案股份有限公司 | **Intellicon Solutions**

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

議程 Agenda

本次規劃涵蓋兩大題目，從設計哲學到實施稽核共九個章節

01 專案背景與設計哲學

GM 現況痛點、四項核心設計原則

02 整體架構：雙層協作

Autonomous Agent × EgentHub 分工

03 題目一：商機分析師

場景、資料、SOP、知識庫

04 題目二：報價策略決策

場景、資料、SOP、知識庫

05 POC 實施規劃與時程

五階段、6 個月甘特圖

06 顧問時數估算

Intellicon 約 150 小時

07 總管理處稽核機制

六大稽核點

08 後續擴展藍圖

第二、三層 Agent 與跨事業群

09 下一步行動建議

立即至 6 個月行動清單

核心問題定義

不是「AI 寫不寫得出報告」，是「判斷流程能不能被組織保存」

現況：藏在資深業務腦中的判斷邏輯

1 商機資訊高度分散

新聞、年報、徵才、原料行情、政府方案各走各的，沒有統一視角

2 早期訊號最有價值卻最容易漏接

客戶剛擴廠的訊號最有價值，但模糊難以量化判斷

3 報價判斷仰賴資深業務

「這價格殺得下去嗎」「這客戶最近有競爭嗎」邏輯藏在腦中

4 新人難以複製、難以交接

資深業務退休或請假，組織能力直接斷層

5 AI 容易過度推論

資料不全時，AI 能「寫」出看似專業實則根據不足的結論

專案目標

不是做一個「會寫報告的 AI」，
而是打造「會遵循 SOP、知道何時該停下來、
並主動要求補資料」的 AI Agent 團隊。

讓判斷可被放大、可被保存、可被新人繼承

交付目標：

從「資深業務的個人英雄主義」
走向「組織級可複製、可稽核的決策能力」

這次同時做兩個 Agent：

商機分析師（事前主動） + 報價策略決策（事中即時）

整體設計原則

兩個 Agent 都遵循這四項核心哲學，是稽核 AI 行為的依據

01

流程優先於模型

先定義「GM 業務應該如何挖商機、如何決策報價」，AI 才介入輔助每個步驟。提示詞與工具都是流程的延伸，不是流程的核心。

02

資料確認是硬閘門

在關鍵資料未確認前，AI 不分析、不推估、不下結論。寧可主動回頭要求業務補資料，也不容許「看似完整但根據不足」的輸出污染決策。

03

判斷邏輯與事實資料分離

判斷規則與估算邏輯內建於 Agent 行為規範；客戶、產業、歷史報價、原料行情則存於企業知識庫。讓兩者各自演化。

04

人機協作，不是全自動

AI 的責任是加速、結構化、指出不確定性。最終商機判斷與報價決策仍由業務或業務主管執行。AI 是夥伴，不是取代。


整體架構：Autonomous Agent × EgentHub 雙層協作

訊號層給「事實」，決策層給「決策」，鬆耦合設計確保未來可替換訊號層

商機分析 AI 雙層協作架構

訊號層 (Autonomous Agent) × 決策層 (EgentHub) × 三方協作

附註：Autonomous Agent 非 EgentHub 既有功能，初期由東元數發處建置；Intellicon 自有方案預計 2026 Q3 推出可評估替換

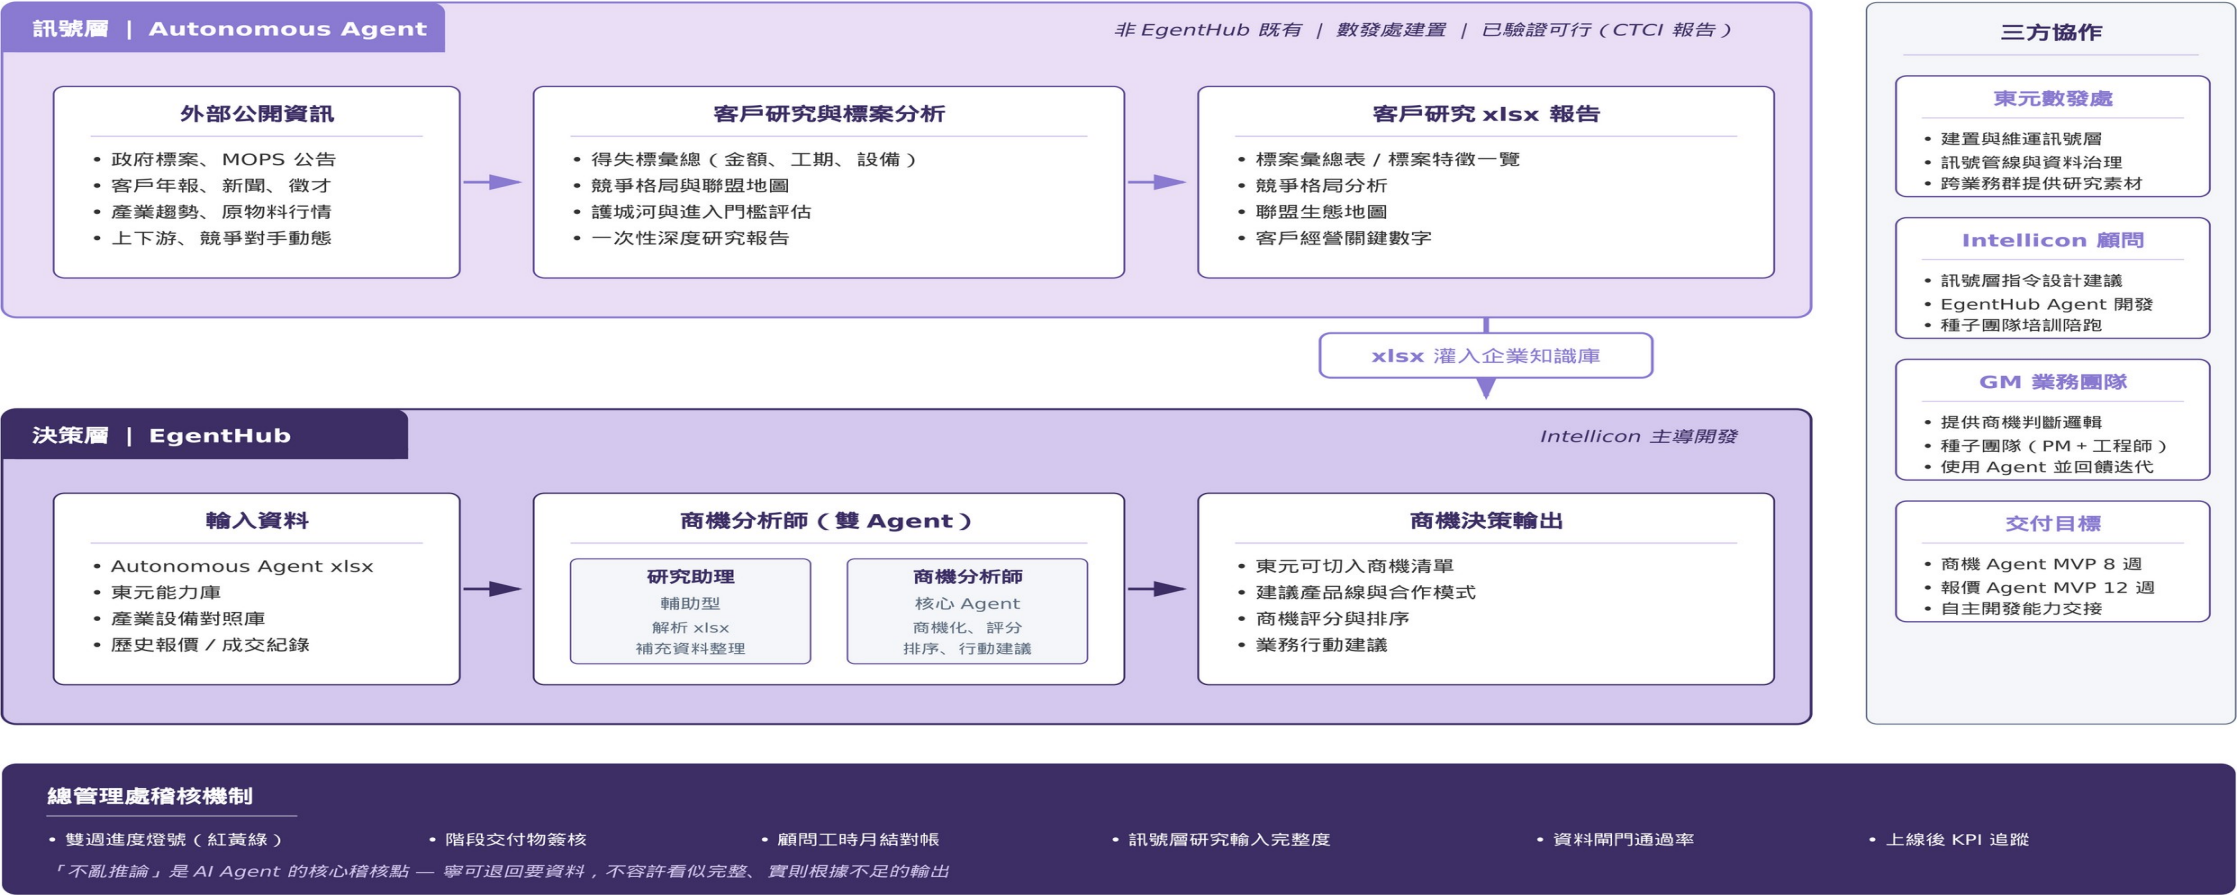

重要附註：Autonomous Agent 技術環境說明

讓總管理處清楚理解工具屬性、責任歸屬、未來替換時點

Autonomous Agent 並非 EgentHub 平台既有功能

Intellicon 可在指令設計、任務拆解、訊號蒐集策略提供顧問建議；初期實際的技術環境建置（執行框架、爬蟲管線、資料儲存、研究報告產出）由東元數發處負責並指派專責人員維運。

現在（POC 期）

數發處主導建置

- 數發處建置技術環境並維運
- Intellicon 提供指令設計與策略建議
- 已驗證可行（CTCI 案）
- 數發處同時累積 Agent 實作經驗

2026 年 Q3

Intellicon 自有方案推出

- Intellicon 原生 Autonomous Agent 上線
- 整合進 EgentHub 成為平台原生能力
- 享有平台層級更新與維運支援
- 跨事業群統一管理

Q3 未評估會議

替換決策點

- 盤點數發處初期建置成果
- 比對 Intellicon 原生方案功能與成本
- 評估跨事業群擴展性
- 鬆耦合設計：替換不影響 EgentHub Agent

鬆耦合設計：訊號層與決策層透過 xlsx 報告中介，未來替換訊號層工具時，決策層 Agent 不需重新開發

三方協作分工

本案涉及三個關鍵單位的協作，AI 工具成為跨單位的共同語言

東元數發處	Intellicon 顧問團隊	GM 業務團隊（種子）
主執行（Execution）	主指導（Coaching）	主共創（Co-creation）
主要職責 - Autonomous Agent 技術環境建置與維運 - 知識庫資料準備（CSV、ERP 拋接） - 簡單提示詞撰寫與迭代測試 - 上線部署與後續維運 投入週期：1-2 位專責人員，全程	主要職責 - 策略指導、SOP 共創主持 - 高難度提示詞撰寫（資料閘門、Phase 4-6） - Code Review 與品質把關 - 種子團隊培訓與陪跑 投入週期：約 150 小時，12 週	主要職責 - 提供商機判斷與報價決策邏輯 - 組成種子團隊（PM 加 1-2 工程師） - 使用 Agent 並回饋迭代 - 資深業務深度訪談（前 4 週為主） 投入週期：全專案週期

此外：GM 與總管理處於雙週節點稽核專案進度與成果；GM 資深業務（受訪者）於前 4 週深度訪談協助提取判斷邏輯

題目一 商機分析師 AI Agent | 場景 × 資料 × 輸出

從「等客戶詢價」轉為「先一步看到機會」

1 應用場景（業務流程）

GM 業務團隊每週收到「商機雷達報告」，列出 Top N 潛在新案。

業務以此作為主動敲門依據；資深業務則用此 Agent 二次驗證自身判斷，並把判斷邏輯沉澱成組織資產。

從「等客戶詢價」轉為「先一步看到機會」。

2 資料輸入與來源

- 外部即時資料：景氣指標、產業新聞、研究報告、政府方案
- 客戶動態：KA 年報、新聞稿、徵才訊息、擴廠計畫
- 原物料行情：銅、矽鋼片、稀土等馬達主原料
- Autonomous Agent 產出 xlsx：標案彙總、競爭格局、聯盟地圖、護城河
- 東元內部：ERP/CRM 詢報價紀錄、成交紀錄、客戶採購週期

3 預期輸出內容

每週一份「商機雷達」，可推送至業務手機 LINE 或 Email。

- 客戶名稱、觸發訊號、建議產品線
- 預估金額區間（標註可信度）
- 建議行動、業務話術建議
- 資料來源與引用
- 資料不足時明確標示「待補資訊」

題目一 商機分析師 | 任務步驟 (Phase 1 至 Phase 7)

Phase 2 「資料閘門」是設計上的硬性條件 — 未確認不分析、不推估、不下結論



Phase 4-6 是 EgentHub Agent 的核心戰場 (Phase 1-3 由 Autonomous Agent 大幅簡化)

Phase 2 「資料閘門」是稽核 AI 是否亂推論的關鍵設計。AI 在資料未確認前，只給「資訊充分度評分」，不給結論。

題目一 商機分析師 | 知識庫需求 與 雙 Agent 架構

知識庫需求

知識庫類型	內容	難度	備註
向量知識庫	產業景氣指標、客戶年報摘要、過往商機案例	中	RAG 技術
SQL 表格庫	歷史報價成交、KA 客戶往來、產品 - 產業對照表	高	本案最大工程
工具呼叫	原物料行情 API、客戶新聞自動推播	中	API 串接
Autonomous Agent xlsx	客戶研究報告灌入企業知識庫	低	已有現成樣本

雙 Agent 架構

Agent 1：研究助理（輔助型）

使用時機：補資料、整理資料時

解析使用者補充的公告、新聞、PDF、Autonomous Agent xlsx，摘要重點並標註可支援哪些商機分析欄位

Agent 2：商機分析師（核心 Agent）

業務的主要入口

負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）

- 比對東元能力庫
- 商機可行性評分
- 排序與行動建議
- 輸出商機雷達週報

規模判斷：大型專案。Autonomous Agent 已扛下訊號蒐集，本 Agent 聚焦於商機化、評分、行動建議三個核心戰場。

題目二 報價策略決策 AI Agent | 場景 × 資料 × 輸出

把資深業務的報價判斷邏輯結構化、可複用、可稽核

1 應用場景（業務流程）

業務人員收到新詢價後，AI 在數分鐘內回吐：

建議報價區間 + 建議交期 + 預估勝率 + 風險提示

業務確認或調整後送出。後續成交與否回填，作為下次學習素材。

資深業務的判斷邏輯被 AI 結構化、複用，新進業務也能產出水準一致的初稿。

2 資料輸入與來源

- 詢價單：規格、數量、客戶、地區、交期需求
- 東元歷史：成交價、落標價、失單價、勝負標籤
- 競爭情報：公開招標結果、業務人員回報
- 成本與產能：BOM 標準成本、即時原料成本、產能排程
- 客戶分級：KA、一般、新客戶分類

3 預期輸出內容

報價建議單（PDF / Excel），業務確認或調整後送出。

- 三檔價格：上限、最適、下限
- 建議交期（含產能風險）
- 預估得標率
- 風險提示：低毛利、產能瓶頸、議價空間
- 可援引的歷史相似案例編號

題目二 報價策略決策 | 任務步驟 (Phase 1 至 Phase 7)

Phase 2 資料閘門：缺口未補齊前，AI 只給「資訊充分度評分」，不給最終價格



Phase 4-6 是核心戰場：把 BOM、原料、產能、勝負紀錄、競價情報組合成可執行的報價策略

資料閘門設計避免 AI 在規格不全時推估出風險很高的報價建議。

題目二 報價策略決策 | 知識庫需求 與 雙 Agent 架構

知識庫需求

知識庫類型	內容	難度	備註
SQL 表格庫	歷史成交（含勝負標籤）、BOM 標準成本、產能排程	高	核心資料源
工具呼叫	原料即時行情 API、ERP 整合查詢工具	中	外部與內部 API
向量知識庫	競爭對手情報筆記、特殊客戶議價歷史	中	業務人員填寫
規則檔	毛利底線政策、客戶分級報價策略	低	業務主管制定

規模判斷：大型專案，比題目一更吃 ERP 與 BOM 整合精度。建議第一階段聚焦最常詢價的前 20% 馬達品項。

雙 Agent 架構

Agent 1：詢價解析助理（輔助型）

使用時機：詢價單進來時

解析詢價單、規格抽取、產品標準化分類、比對歷史相似案件

Agent 2：報價策略分析師（核心）


業務的主要入口

負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）

- 成本與毛利試算
- 三檔報價建議與勝率預估
- 風險提示與議價空間分析
- 成交結果回填學習

POC 實施規劃 | 6 個月、五階段甘特圖

兩案併行，分階段推進，讓東元 GM 數發處有充裕時間消化、迭代與優化

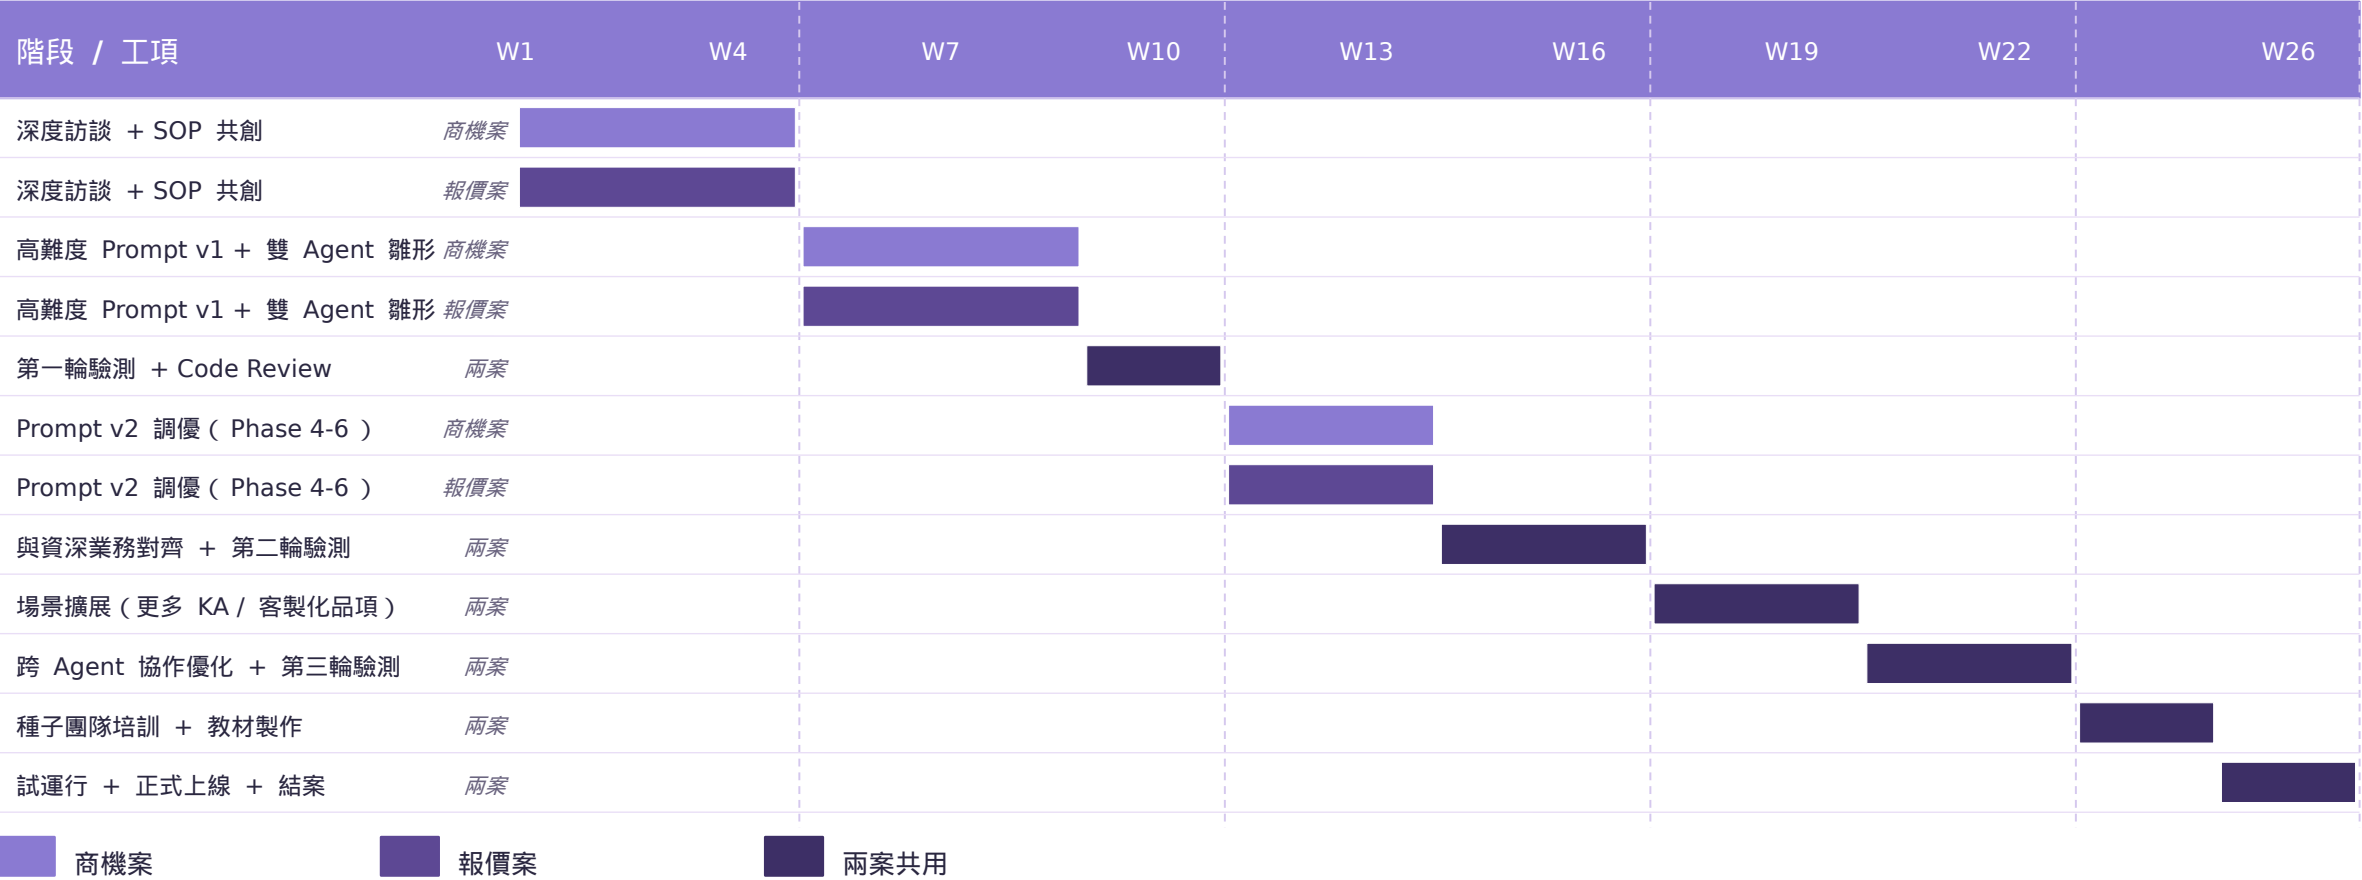

Phase 1 啟動 (W1-4) 30h | Phase 2 基礎建置 (W5-10) 36h | Phase 3 迭代調優 (W11-16) 30h | Phase 4 擴展優化 (W17-22) 24h | Phase 5 培訓交接 (W23-26) 30h

6 個月、26 週、合計約 150 小時 — 各 Phase 之間的執行緩衝期，讓 GM 數發處能充分消化每階段成果、累積實作經驗。

顧問時數估算 | 6 個月 約 150 小時

Intellicon 指導 + 東元數發處執行 + GM 種子團隊共創 — 分階段交付，循序漸進

Intellicon 分階段投入明細

階段	週次	Intellicon 主要工項	時數
Phase 1 啟動	W1-W4	Kickoff、業務深度訪談主持、SOP 共創、知識庫架構指導	30 h
Phase 2 基礎建置	W5-W10	高難度 Prompt v1、雙 Agent 協作邏輯、第一輪驗測陪審	36 h
Phase 3 迭代調優	W11-W16	高難度 Prompt v2 調優、與資深業務對齊、第二輪驗測	30 h
Phase 4 擴展優化	W17-W22	場景擴展指導、跨 Agent 協作優化、第三輪驗測、Final Review	24 h
Phase 5 培訓交接	W23-W26	種子團隊培訓主講、教材製作、試運行、結案、知識交接	30 h
合計	26 週	兩案併行 (Intellicon 顧問時數)	約 150 h

Intellicon 顧問總時數

約 150 小時

6 個月 | 26 週

分階段交付，循序漸進

分工原則的兩個關鍵設計

Intellicon 聚焦四個高槓桿環節：

- 高難度提示詞撰寫 (Phase 2 + Phase 3)
- Code Review 與品質把關
- 資深業務判斷邏輯對齊
- 種子團隊培訓 (Phase 5)

6 個月節奏的關鍵價值：

各 Phase 之間的緩衝期讓 GM 數發處有充裕時間執行、迭代、累積經驗。

總管理處稽核機制 | 六大稽核點

讓專案進度、資源、AI 行為品質都能被定期審視

01 雙週進度燈號

對照甘特圖工項，紅黃綠燈呈現

負責：PM 提交、總管理處審視

頻率：雙週

02 階段交付物簽核

SOP、知識庫、行為規範、提示詞、驗測報告

負責：GM 主管 + 總管理處共同簽核

頻率：每階段

03 顧問工時月結對帳

逐週工時表 + 工項對應

負責：總管理處對帳

頻率：每月

04 Autonomous Agent 研究輸入完整度

每個商機案需附 Autonomous Agent 報告或同等素材

負責：資料閘門通過硬條件

頻率：每案

05 資料閘門通過率

Agent 啟動「資料閘門退回」次數與原因

負責：稽核 AI「不亂推論」的核心指標

頻率：每月

06 上線後 KPI 追蹤


新商機數、轉換率、得標率、報價週期、毛利

負責：GM 業務主管 + 總管理處

頻率：上線後每月

後續擴展藍圖 | 三層架構 + 跨事業群

每季新增 2-3 個 Agent，Intellicon 從主導逐步轉為教練陪跑

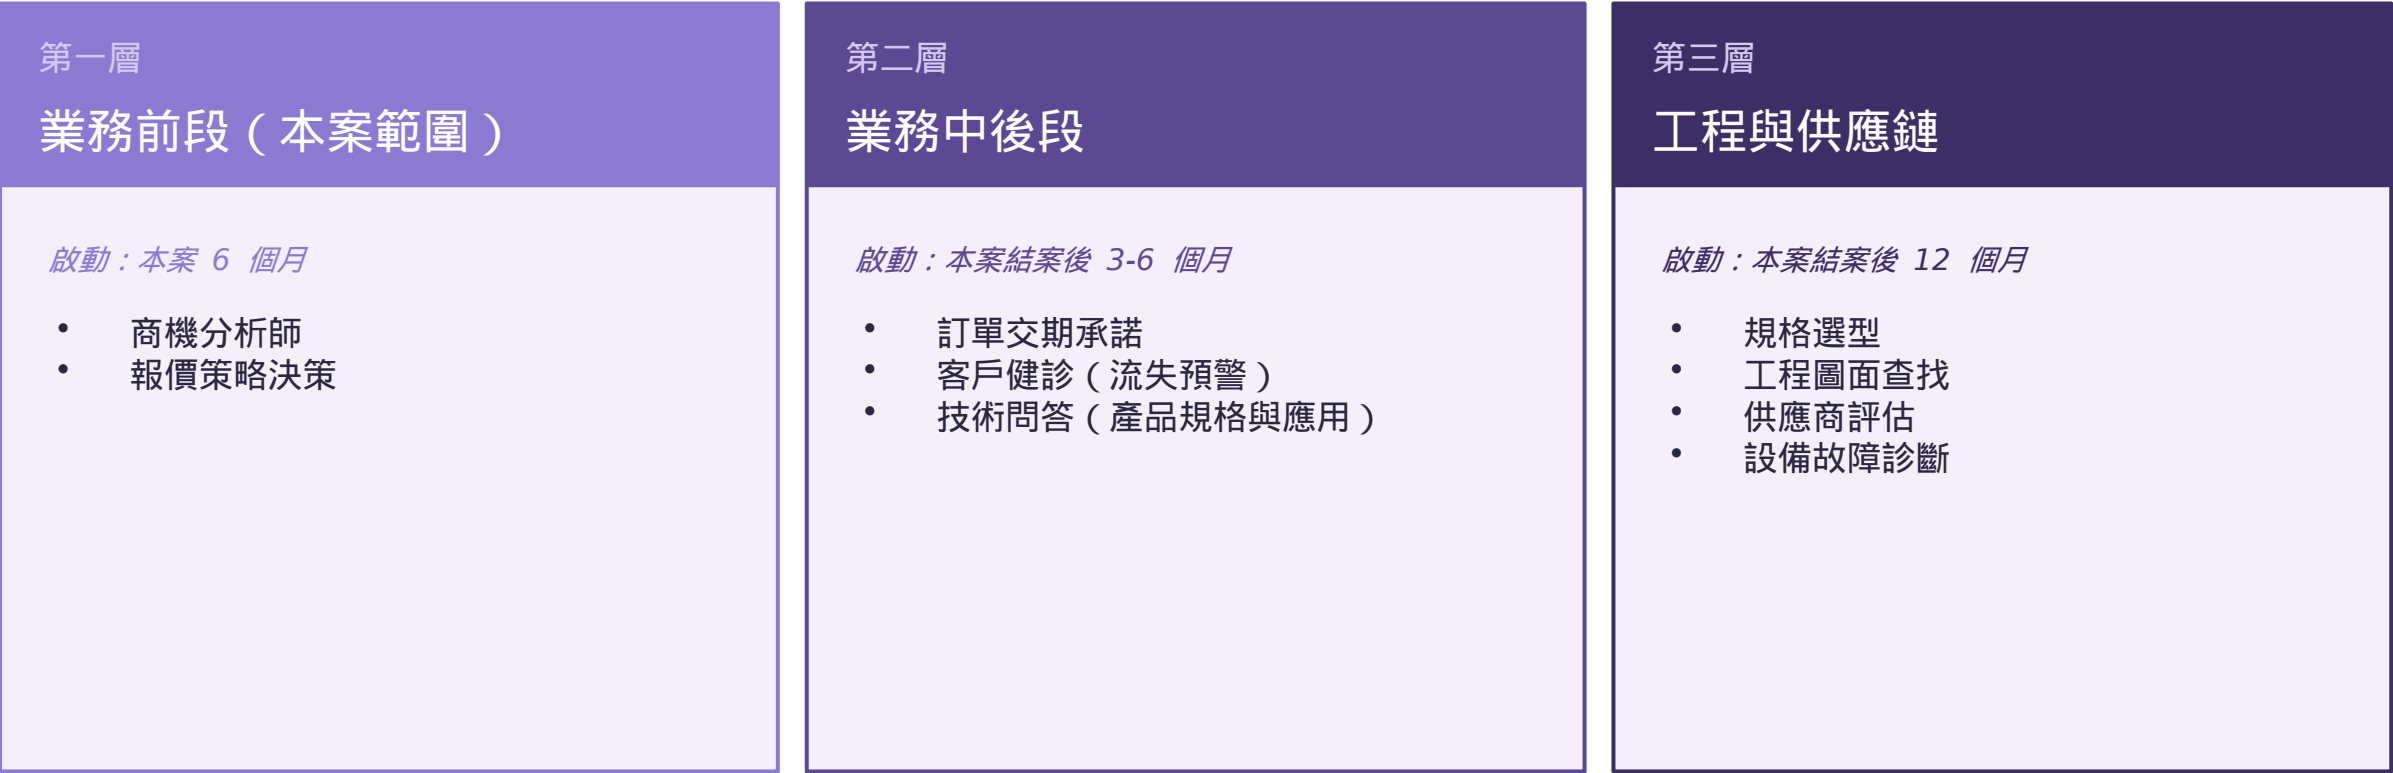

跨事業群擴展可能性

商機分析師與報價策略 Agent 在 GM 完成驗證後，可快速複製至電力能源（PE）與空調科技（HT）事業群。

Autonomous Agent 訊號層由數發處跨事業群共用，這是本架構長期 ROI 最高的部分。

下一步行動清單

從立即行動到 6 個月內，明確的時程與責任

時程	行動項目	負責單位
立即	確認本規劃書方向；安排 GM 業務深度訪談排程	GM 業務主管 + Intellicon
1 週內	東元數發處啟動 Autonomous Agent 技術環境規劃；確認 POC 目標客戶清單（3-5 家 KA）	數發處 + GM 業務 + Intellicon
2 週內（Phase 1 啟動）	Kickoff Meeting；種子團隊組成（PM 加 1-2 工程師）；資料源盤點	GM + Intellicon + 總管理處
1 個月（Phase 1 完成）	GM 業務深度訪談與 SOP 共創完成；知識庫骨架建置	種子團隊 + Intellicon
2.5 個月（Phase 2 完成）	Agent MVP 雛形完成；第一輪驗測通過	種子團隊 + Intellicon
4 個月（Phase 3 完成）	Agent v2 內部試用上線；KPI 量測初步結果	種子團隊 + Intellicon
5.5 個月（Phase 4 完成）	場景擴展、跨 Agent 協作優化、Final Review	種子團隊 + Intellicon
6 個月（Phase 5 結案）	種子團隊培訓認證、正式上線；評估跨事業群（PE / HT）複製	GM + PE + HT + 總管理處

給總管理處的具體請求

核准本規劃書與 150 小時顧問時數估算 | 指派一位協調窗口參與雙週進度會議
批准 GM 種子團隊（1 PM + 1-2 工程師）6 個月投入承諾 | 批准數發處建置 Autonomous Agent 技術環境資源
確認資料閘門通過率作為核心稽核指標
