

東元電機 空調科技事業群 (HT)

AI Agent 導入規劃書

門市銷售預測 × 巡店與展店行動建議

單層 EgentHub × 組織級知識累積

智慧方案股份有限公司 | Intellicon Solutions

EgentHub 企業 AI Agent 平台

2026 年 5 月

議程 Agenda

本案涵蓋 HT 通路業務的四大關鍵負擔，從設計理念到實施稽核共九個章節

01 HT 通路業務的兩大關鍵負擔

銷售估算 + 合約判讀的人工負擔

02 本案的設計理念

五項核心原則、單層 EgentHub 架構

03 題目一：銷售流程引導

場景、資料、SOP、知識庫

04 題目二：合約 / 文件判讀

場景、資料、SOP、知識庫

05 POC 實施規劃與時程

五階段、5 個月甘特圖

06 顧問時數估算

Intellicon 約 100 小時

07 總管理處稽核機制

六大稽核點

08 組織級知識累積藍圖

PE 三大知識庫的長期價值

09 下一步行動建議

立即至 5 個月行動清單

HT 業務的四大關鍵負擔

資料量大但難以萃取行動 — 不是缺資料，而是缺結構化的解讀方法

1

銷售資料看得到、用不上

每天 POS 匯出大量資料，但區經理拿到後不知從何開始；人工整理一份報表往往要花掉半天

2

下滑主因眾多但難以歸因

員工流動 / 商圈變化 / 競品衝擊 / 促銷檔期 / 季節影響 — 5 種候選原因組合，人工歸因高度主觀

3

巡店時間有限但要去的店多

區經理時間有限，30 家店都該去，目前依直覺排序，缺乏資料支撐的客觀標準

4

展店評估缺乏結構化方法

每次評估靠直覺與經驗，歷史成功與失敗案例的學習點沒有系統性沉澱

這四個負擔的本質都是「資料量大但難以萃取行動」 — 透過 **AI Agent** 結構化解讀，可一次解決。

本案的五項核心設計原則

其中原則四「解釋優先於預測」是 HT 案的特有設計

01

流程優先於模型

先定義「HT 區經理應該如何看銷售資料、如何決定巡店優先級、如何評估展店」，AI 才介入輔助每個步驟。

02

資料閘門 — POS 品質是硬條件

品類分類不一致、日期跳日、銷售件數異常時，Agent 主動退回要求補資料；不對殘缺資料做預測。

03

判斷邏輯與資料分離

預測模型、異常偵測規則、巡店優先級邏輯內建於 Agent；門市、商圈、銷售、巡店、展店資料則存於知識庫。

04

HT 特有

解釋優先於預測

預測數字本身不重要，重要的是「為什麼會這樣」與「該怎麼做」。沒有解釋的預測不是有用的預測。

05

人機協作，不是全自動

AI 的責任是加速、結構化、指出不確定性。最終巡店、展店、促銷決策仍由區經理、營業部主管、決策者執行。

為什麼這 5 項原則同時存在

這 5 項原則合在一起，是 HT 案 AI Agent 的「行為憲法」— 解釋優先於預測讓區經理拿到的不只是數字而是行動方向；其他四項是流程、品質、資料、協作的基本盤。

整體架構：單題目雙 Agent | 從資料到行動的完整鏈路

兩個 Agent 各自獨立可用，加總起來就是「從看資料到做決策」的完整流程

題目 22：門市銷售預測與巡店建議



早上看 1.1 的儀表板了解門市表現，下午用 1.2 規劃巡店與評估展店候選地點 — 區經理一天的完整工作流。

HT 三大組織級知識庫

本案最有長期價值的資產 — 持續累積與更新，最終成為 HT 通路業務的「決策大腦」

AI Agent 是工具，組織級知識庫才是長期資產

本案會把 HT 內部分散的 POS 資料、商圈資訊、巡店紀錄、展店案例整理成 3 個結構化知識庫。這些知識庫會隨著每日 POS 資料、每次巡店、每次展店評估持續更新，是本案最有長期價值的產出。

KB 1

銷售資料分析庫

服務 Agent 1.1 銷售資料分析

- 每日 POS 銷售明細（店 × 品類 × 期間）
- 門市基本資料、商圈與競品資訊
- 季節指數、促銷檔期、巡店歷史議題

回饋更新機制：

POS 系統每日自動拋接；商圈資訊每季更新

KB 2

巡店判斷邏輯庫

服務 Agent 1.2 巡店建議

- 區經理巡店優先級評分邏輯
- 歷次巡店識別的議題類別與處理方式
- 跨店對策與成效紀錄

回饋更新機制：

每次巡店後，由 PM 回填新議題類型與處理方式；後續成效追蹤

KB 3

展店評估案例庫

服務 Agent 1.2 展店評估

- 歷史展店候選地評估結果
- 實際開店表現追蹤（達標率、毛利）
- 成功與失敗案例的學習點

回饋更新機制：

每次展店決策後（成功與否）回填學習點；持續累積成展店方法論

三庫合一 = HT 通路決策大腦：分析資料時引用「銷售資料 + 商圈 + 巡店紀錄」；做行動建議時引用「巡店邏輯 + 展店案例」

三方協作分工

本案涉及三個關鍵單位的協作，讓每個單位都能在熟悉的領域發揮

東元數發處 主執行 (Execution) 主要職責 - EgentHub 知識庫資料準備 (SOP 文件、CSV、PM 系統拋接) - 簡單提示詞撰寫與迭代測試 - Code Review 後修正 - 上線部署與後續維運 投入週期：1-2 位專責人員，全程	Intellicon 顧問團隊 主指導 (Coaching) 主要職責 - 策略指導、SOP 與條款庫骨架共創主持 - 高難度提示詞撰寫 (資料闡門、文件完整性闡門、跨角色視角) - Code Review 與品質把關 - 種子團隊培訓與陪跑 投入週期：約 100 小時，5 個月	HT 通路業務團隊 (種子) 主共創 (Co-creation) 主要職責 - 提供區經理巡店判斷邏輯、展店評估方法論、銷售分析慣例 - 組成種子團隊 (PM 加 1-2 位區經理) - 使用 Agent 並回饋迭代 - 資深區經理深度訪談 (前 3 週為主) 投入週期：全專案週期
---	--	---

此外：PE 與總管理處於雙週節點稽核專案進度與成果；PE 資深區經理 (受訪者) 於前 3 週深度訪談協助提取判斷邏輯與條款風險知識

題目 22 門市銷售預測與巡店建議 | 場景 × 資料 × 輸出

讓資深區經理的判斷邏輯變成可重複執行的決策大腦

1 應用場景（業務流程）

HT 通路業務（區經理、營業部主管、營運高層）
以兩種模式使用本系統：

模式一 每日銷售儀表板：早上貼上上一日 POS
匯出，5 分鐘內產出儀表板

模式二 巡店與展店規劃：週一早會前用 1.2 規劃
本週巡店與展店候選地評估

2 資料輸入與來源

- 每日銷售明細（POS 系統匯出）
- 門市基本資料（店型、商圈、員工、店長年資）
- 商圈與競品資訊（密度、客流、租金、客層）
- 季節性與促銷檔（季節指數、檔期）
- 巡店紀錄與議題（歷次巡店識別的議題）
- 展店評估參考案例（歷史展店成功與失敗）

3 預期輸出內容

依模式給不同輸出。

- 儀表板：各店各品類排名、異常店清單
- 下滑主因初判（5 種候選原因組合）
- 未來 1-4 週需求預測（含解釋）
- 本週巡店優先順序（含分數）
- 跨店對策建議
- 展店評估報告（推薦 / 觀望 / 不推薦）

題目 22 門市銷售預測與巡店建議 | 任務步驟 (Phase 1 至 Phase 7)

Phase 2 「資料品質閘門」確保 AI 不對殘缺 POS 資料做預測；Phase 4-6 強調解釋優先於預測

Phase 1 需求定義	Phase 2 資料品質閘門	Phase 3 資料結構化	Phase 4 異常偵測 + 主因歸因	Phase 5 需求預測 + 解釋	Phase 6 行動優先級排序	Phase 7 輸出成果
使用者選擇模式：每日儀表板 / 巡店規劃 / 展店評估	盤點 POS 資料品質：日期完整性、品類分類一致性、件數合理性；< 60 分退回 硬閘門	整理為「店 × 品類 × 期間」立方體；標準化品類名稱、補齊缺漏日期	找出環比下滑 -15% 以上的店；從 5 種候選原因組合中比對最可能主因 核心戰場	基於季節指數 × 促銷檔 × 商圈活動，預測未來 1-4 週需求；每筆預測附解釋 核心戰場	巡店：依議題嚴重度 × 時效 × 難度 × 歷史成效給優先級；展店：依歷史相似案例比對 核心戰場	依模式產出儀表板報告或行動建議報告

Phase 4-6 是核心戰場：異常偵測 + 主因解釋 (不只給數字) + 行動優先級排序

Phase 2 「資料品質閘門」設計避免 AI 對殘缺 POS 資料做出誤導性預測。資料品質低於 60 時退回要求補資料。

題目 22 門市銷售預測與巡店建議

| 知識庫需求 與 雙 Agent 架構

知識庫需求

知識庫類型	內容	難度	備註
SQL 表格庫	每日銷售明細 (POS 匯出)	高	需 POS 系統定期拋接
SQL 表格庫	門市基本資料、商圈與競品、季節與促銷、巡店紀錄、展店評估案例	中	本案核心資料源
規則檔	異常偵測閾值、巡店優先級權重、展店評估評分標準	低	區經理共同制定

雙 Agent 架構

Agent 1：銷售資料分析助手（核心型）

使用時機：每日 POS 匯入後

處理 POS 資料、預測、異常偵測；輸出儀表板報告，含環比、預測、下滑主因解釋

Agent 2：巡店與展店行動助手（核心型）

基於 1.1 儀表板，產出可執行行動


產出巡店優先級、跨店對策、展店評估

- 本週巡店優先順序（含分數）
- 每店重點關注事項（援引巡店紀錄）
- 需立即啟動的跨店對策
- 展店評估報告（推薦 / 觀望 / 不推薦）

規模判斷：中型專案。最大工程是 POS 系統定期拋接機制與下滑主因歸因規則庫的建立，由數發處主執行。

POC 實施規劃 | 5 個月、五階段甘特圖

兩案併行，分階段推進，讓 HT 數發處有充裕時間消化、迭代與優化

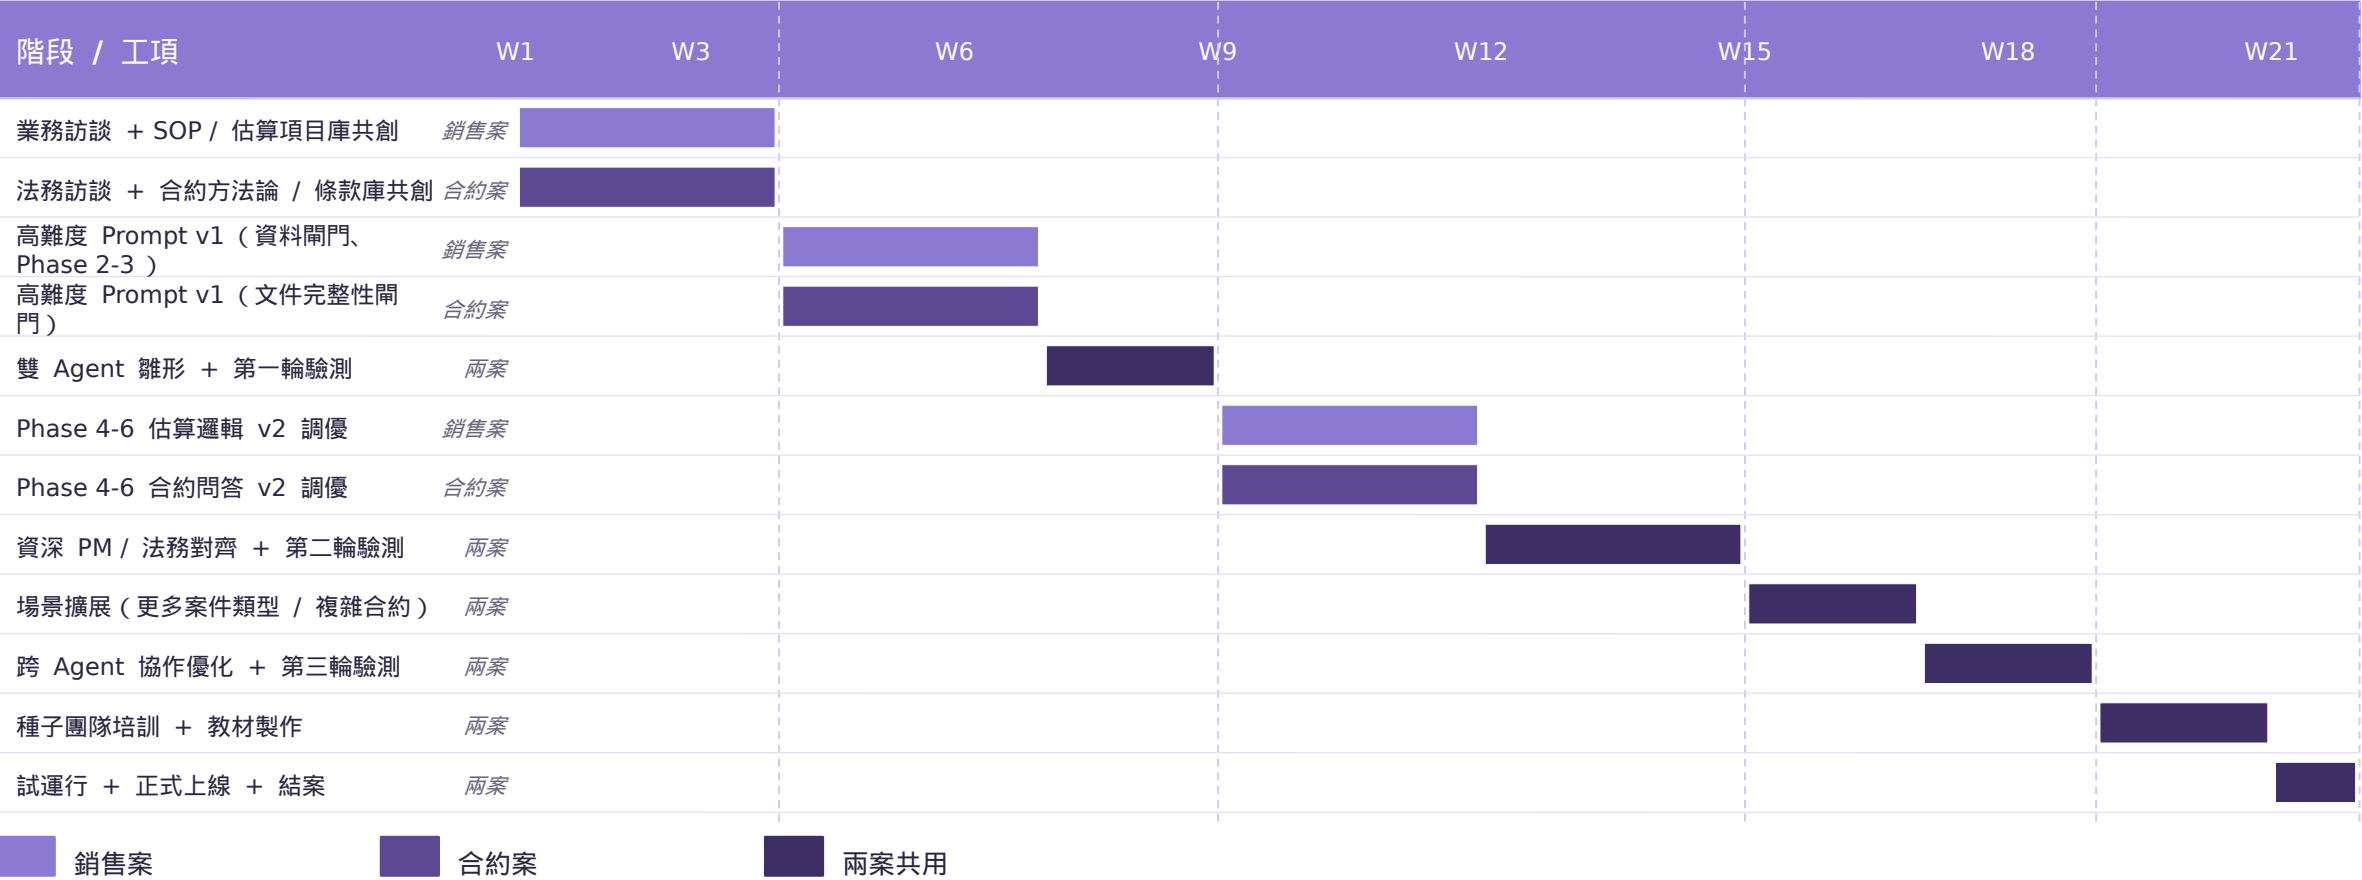

Phase 1 啟動 (W1-3) 24h | Phase 2 基礎建置 (W4-8) 32h | Phase 3 迭代調優 (W9-14) 28h | Phase 4 擴展優化 (W15-18) 20h | Phase 5 培訓交接 (W19-21) 26h

5 個月、17 週、合計約 100 小時 — 各 Phase 之間的執行緩衝期，讓 HT 數發處能充分消化每階段成果、累積實作經驗。

顧問時數估算 | 5 個月 約 100 小時

Intellicon 指導 + 東元數發處執行 + HT 種子團隊共創 — 分階段交付，循序漸進

Intellicon 分階段投入明細

階段	週次	Intellicon 主要工項	時數
Phase 1 啟動	W1-W3	Kickoff、區經理深度訪談、SOP 與條款庫骨架共創	24 h
Phase 2 基礎建置	W4-W8	高難度 Prompt v1（資料閘門、文件完整性閘門）、雙 Agent 雛形、第一輪驗測	32 h
Phase 3 迭代調優	W9-W14	Prompt v2 調優、與資深區經理對齊、第二輪驗測	28 h
Phase 4 擴展優化	W15-W18	場景擴展指導、跨 Agent 協作優化、第三輪驗測、Final Review	20 h
Phase 5 培訓交接	W19-W21	種子團隊培訓主講、教材製作、試運行、結案、知識交接	26 h
合計	17 週	兩案併行（Intellicon 顧問時數）	約 100 h

Intellicon 顧問總時數

約 100 小時

4 個月 | 17 週

分階段交付，循序漸進

分工原則的兩個關鍵設計

Intellicon 聚焦四個高槓桿環節：

- 高難度提示詞撰寫（資料閘門、文件完整性閘門）
- Code Review 與品質把關
- 資深區經理判斷邏輯對齊
- 種子團隊培訓（Phase 5）

5 個月節奏的關鍵價值：

各 Phase 之間的緩衝期讓 HT 數發處有充裕時間執行、迭代、累積經驗。

總管理處稽核機制 | 六大稽核點

讓專案進度、資源、AI 行為品質都能被定期審視

01 雙週進度燈號

對照甘特圖工項，紅黃綠燈呈現

負責：PM 提交、總管理處審視

頻率：雙週

02 階段交付物簽核

SOP、知識庫、行為規範、提示詞、驗測報告

負責：HT 主管 + 總管理處共同簽核

頻率：每階段

03 顧問工時月結對帳

逐週工時表 + 工項對應

負責：總管理處對帳

頻率：每月

04 Autonomous Agent 研究輸入完整度

每個商機案需附 Autonomous Agent 報告或同等素材

負責：資料閘門通過硬條件

頻率：每案

05 資料閘門通過率

Agent 啟動「資料閘門退回」次數與原因

負責：稽核 AI「不亂推論」的核心指標

頻率：每月

06 上線後 KPI 追蹤

新商機數、轉換率、得標率、報價週期、毛利

負責：HT 通路業務主管 + 總管理處

頻率：上線後每月

後續擴展藍圖 | PE 三大知識庫的長期擴展

本案結案後，三大知識庫持續累積，逐步擴展案件類型與應用情境

短期 本案結案後 3-6 個月	中期 本案結案後 6-12 個月	長期 本案結案後 12 個月以上
啟動：HT 數發處主導 - 擴展案件類型（離岸風電、車用動力、海外合約） - 更多歷史案件回填 - 條款庫每季 review	啟動：HT 數發處與 IT 部門合作 - 整合 PM 系統，案件全週期追蹤 - 條款庫與 ERP 雙向同步 - 知識庫管理介面建置	啟動：HT 通路業務團隊主導應用方向 - PE 決策大腦對外延伸 - 業務簽約前直接調用紅旗檢核 - 投標前由業務調用估算試算

跨事業群擴展可能性

商機分析師與報價策略 Agent 在 GM 完成驗證後，可快速複製至電力能源（PE）與空調科技（HT）事業群。

即使資深區經理退休，這份組織級記憶仍能傳承給新人 — 這是本案最有長期價值的產出。

下一步行動清單

從立即行動到 5 個月結案，明確的時程與責任

時程	行動項目	負責單位
立即	確認本規劃書方向；安排 HT 通路業務深度訪談排程	HT 通路業務主管 + Intellicon
1 週內	東元數發處啟動 Autonomous Agent 技術環境規劃；確認 POC 目標客戶清單（3-5 家 KA）	數發處 + HT 通路業務 + Intellicon
2 週內（Phase 1 啟動）	Kickoff Meeting；種子團隊組成（PM 加 1-2 工程師）；資料源盤點	GM + Intellicon + 總管理處
1 個月（Phase 1 完成）	HT 通路業務深度訪談與 SOP 共創完成；知識庫骨架建置	種子團隊 + Intellicon
2.5 個月（Phase 2 完成）	Agent MVP 雛形完成；第一輪驗測通過	種子團隊 + Intellicon
4 個月（Phase 3 完成）	Agent v2 內部試用上線；KPI 量測初步結果	種子團隊 + Intellicon
5.5 個月（Phase 4 完成）	場景擴展、跨 Agent 協作優化、Final Review	種子團隊 + Intellicon
5 個月（Phase 5 結案）	種子團隊培訓認證、正式上線、結案；後續擴展規劃	PE + 總管理處

給總管理處的具體請求

核准本規劃書與 100 小時顧問時數估算 | 指派一位協調窗口參與雙週進度會議
批准 HT 種子團隊（1 PM + 1-2 工程師）5 個月投入承諾 | 批准數發處投入 PE 知識庫整理資源（含法務支援）
確認文件完整性開門通過率與資料開門通過率作為核心稽核指標
